

週 間 工 程 表

大 ⑪

工 事 名 H29寺山堤防強化(上)工事
工 事 場 所 茨城県猿島郡五霞町寺山地先
工 期 自)平成29年 10月13日～至)平成30年 3月28日

進 捗 率 (平成30年1月25 日現在)	計 画	66.0%	—
	実 施	65.8%	—

受注者 株式会社 島村工業
作成者 現場代理人 岡村 飛馬
作成日 平成30年1月25日

年 月 日 工種・種別		今週						来週(計画工程)						再来週(計画工程)						備 考					
		1月											2月												
		22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火	31 水	1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木			9 金	10 土	11 日	
工 種	付帯道路工	下部据付																		上部据付					
	側溝工(堤脚水路)																								
	法尻処理工								再生骨材投入		割栗石投入														
	湿润化防止工																								
	河川土工	盛土材運搬																							
	盛土工																								
種	法面整形工									キャリブ															
	構造物撤去工										↔														
	既設坂路舗装版																								
項 目	段階確認、立会確認等											湿润化防止 工立会い													
	行事予定					工程会議 9:00						工程会議 9:00								工程会議 9:00					
使用坂路	IN	10tDT 4台 原坪 8:30	10tDT 4台 原坪 8:30	10tDT 4台 原坪 8:30	10tDT 4台 原坪 8:30	10tDT 4台 原坪 8:30			10tDT 4台 原坪 8:30	10tDT 4台 原坪 8:30	10tDT 4台 原坪 8:30	10tDT 4台 原坪 8:30	10tDT 4台 原坪 8:30			10tDT 4台 原坪 8:30	10tDT 4台 原坪 8:30								
	OUT	10tDT 4台 原坪 17:00	10tDT 4台 原坪 17:00	10tDT 4台 原坪 17:00	10tDT 4台 原坪 17:00	10tDT 4台 原坪 17:00			10tDT 4台 原坪 17:00	10tDT 4台 原坪 17:00	10tDT 4台 原坪 17:00	10tDT 4台 原坪 17:00	10tDT 4台 原坪 17:00			10tDT 4台 原坪 17:00	10tDT 4台 原坪 17:00								
誘導員配置予定	126K付近 土取場	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1								
	127K付近 原坪天端	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1												
	127K付近 原坪工事用道路	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1												


《その他・懸案事項》	休日作業日					緊急連絡先
	作業箇所					現場代理人：岡村 飛馬
	作業内容					080-9263-0098
	作業人員					監理技術者：太田 誠
	使用機械					090-2317-0071



盛土状況



堤脚水路 据付作業

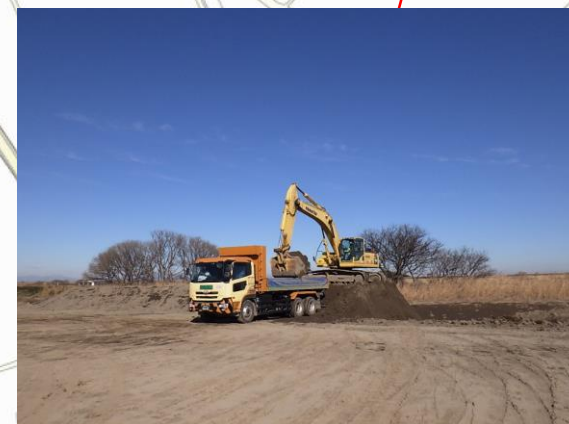

土砂採取場
