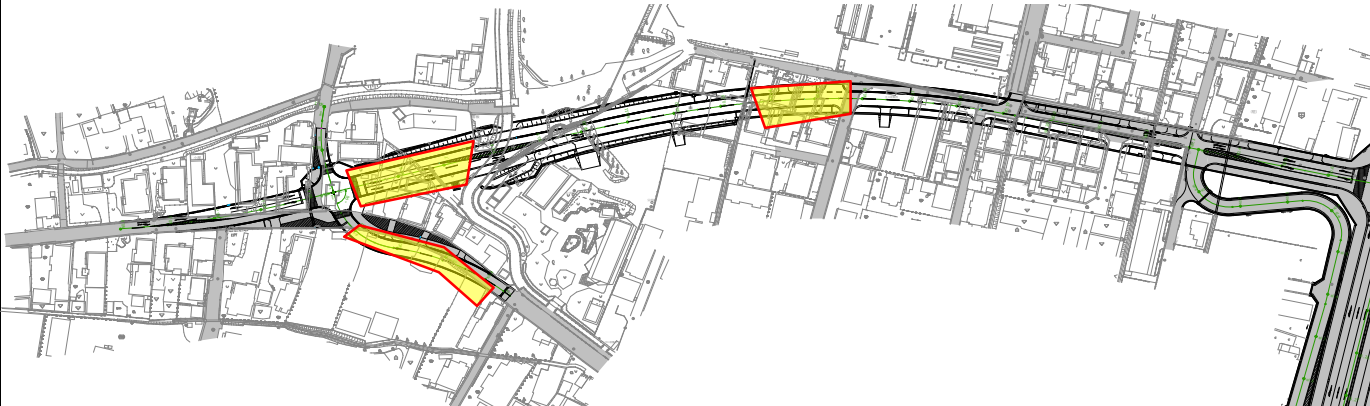


週 間 工 事 工 程 表

令和2年5月15日

NO.16

工 事 名	令和元年度 社街A2-A01号 小山道路改築工事															工 期		令和元年10月18日 ～ 令和2年9月30日										現 場 代 理 人		佐藤 正芳		進 捗 率	計 画		42.4 %	
受 注 者	グリーン企画建設株式会社															週 間 工 程		令和2年5月17日 ～ 令和2年5月24日										監 理 技 術 者		佐藤 正芳			実 施		35.5 %	
工種	位置	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	安 全 重 点 目 標													
準備工 事前調査・施工計画																								・重機作業半径立入禁止措置の徹底 ・作業前の体調確認の徹底 ・吊り金具点検の実施												
排水構造物土工	終点側																							連 絡 事 項												
集水樹工	終点側																							・来週から電力柱移設予定 ・ふたば幼稚園バス駐車場側溝施工（2分割施工） ・明日は施工予定												
階段工（重力擁壁）	起点側																							段 階 確 認 ・ 立 会 予 定												
集水樹工	起点側																							日 付												
横断管渠工/排水構造物工	起点側																							時 間												
行事 名取第一中																								場 所												
ふたば幼稚園																								項 目												
施工位置図																							施 工 状 況 写 真													
																																				
凡例 ： 施工予定場所																							側溝据付状況													
