

週 間 工 程 表
(休日作業届)

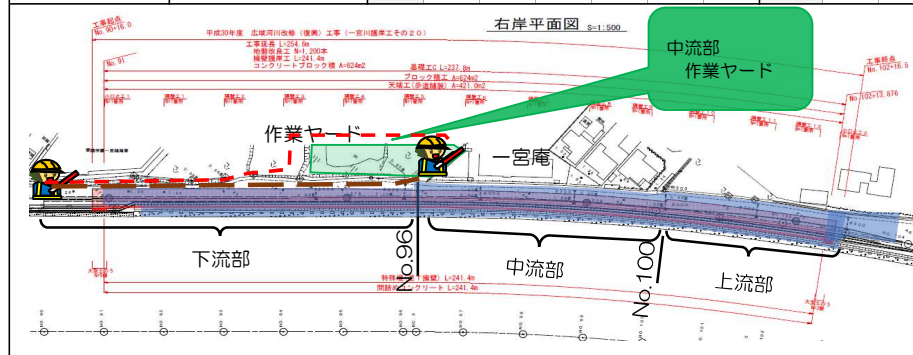
工事番号30-150

令和2年10月6日 作成

現場代理人	監理技術者
石井	石井

工 事 名	広域河川改修(復興)工事(一宮川護岸工その20)
請 負 者	片岡工業 株式会社
工 期	平成31年 2月19日～令和 3年 1月 8日
期 間	令和 2年10月 4日～令和 2年10月24日

海岸沿町道 トライプス
準備 トライプス 片付

[illegible]

凡例

- 再来週
- 今週・来週
- 実施
- 作業ヤード
- 施工ヤード
- 歩行者通路
対応時
- 一車線開放
対応時

休日作業届

作業内容	作業工種	仮設工 工事用道路 敷設板 法面補修工 法面擁壁工 作業土工・積込	仮設工 工事用道路 敷設板 法面補修工 法面擁壁工 作業土工・積込	仮設工 工事用道路 敷設板 法面補修工 法面擁壁工 作業土工・積込 付帯道路施設工	仮設工 工事用道路 敷設板 法面補修工 法面擁壁工 作業土工・積込 付帯道路施設工	仮設工 工事用道路 敷設板 法面補修工 法面擁壁工 作業土工・積込 付帯道路施設工	
		作業場所	工区内、一松宇砂畑六甲	工区内、一松宇砂畑六甲	工区内、一松宇砂畑六甲	工区内、一松宇砂畑六甲	工区内、一松宇砂畑六甲
		作業員人数	10人	10人	10人	10人	10人
		主要機械等	バ ヱ ャ ム ゴ ン 等	バ ヱ ャ ム ゴ ン 等	バ ヱ ャ ム ゴ ン 等	バ ヱ ャ ム ゴ ン 等	バ ヱ ャ ム ゴ ン 等
	作業理由	工程調整の為	工程調整の為	工程調整の為	工程調整の為	工程調整の為	
区 分	休日	休日	休日	休日	休日	休日	
作業年月日	9月27日(土)	10月3日(土)	10月11日(土)	10月18日(土)	10月25日(土)		

懸案事項等

○10/7(水)で実施出来高91.0%
