

利根川工事だより ～常木・名地区自治会版～

平成 30 年 1 月 号



発行元 川俣出張所 常木地区安全協議会

発行責任者 内田・大里経常建設共同企業体

現場代理人 澤崎 武雄 大里産業 (株)

監理技術者 佐藤 淳哉 (株) 内田組

担当技術者 大里美知子 大里産業 (株)

～地域の皆様へ～

新年を向かえ、町を行き交う人たちにも明るい緊張感を覚える日々ですが、皆様お元気で過ごしのことと存じます。

常日頃より皆様方には利根川治水事業におきまして、御理解と御協力をいただき、誠に有難う御座います。

本工事でも12月中に湿潤化防止工・砂質土盛土・段切りの作業を完了させ、1月から土砂運搬・盛土作業を本格スタート致します。

工事施工中は、地域の皆様や河川利用者の方々には御不便をおかけ致しますが、安全第一を心がけ強固な堤防を構築致しますので、御理解と御協力を宜しくお願い致します。

☆工事についてお気づきの点がございましたら、お気軽にお声かけください。

○工事に関するお問い合わせ先

・現場事務所(常木作業所)埼玉県羽生市名901-1

・TEL 048-577-4944 ・FAX 048-577-4958

・現場代理人 澤崎 武雄 携帯電話 090-5822-6832

・監理技術者 佐藤 淳哉 携帯電話 090-1536-2680

・施工業者 内田・大里経常建設共同企業体

・工事名 H29 常木堤防強化(下)工事

・工事期間 平成29年9月8日～平成30年3月19日

・作業時間 土・日曜日・祝日を除く8:00から17:00

※現場見学台(右図参照)に、意見箱を設けてありますので、そちらにもお気軽にご意見お寄せください。

川の防災情報

<http://www.river.go.jp/> (PC版)

<http://www.river.go.jp/s/> (スマートフォン)

<http://i.river.go.jp/> (携帯版)



河川に関する問い合わせ

国土交通省 関東地方整備局
利根川上流河川事務所 川俣出張所
TEL 048-563-1992


H29 常木堤防強化(下)工事

施工業者: 内田・大里経常建設共同企業体

利根川 堤防強化対策情報

工事番号 5

平成30年1月の工事の作業予定

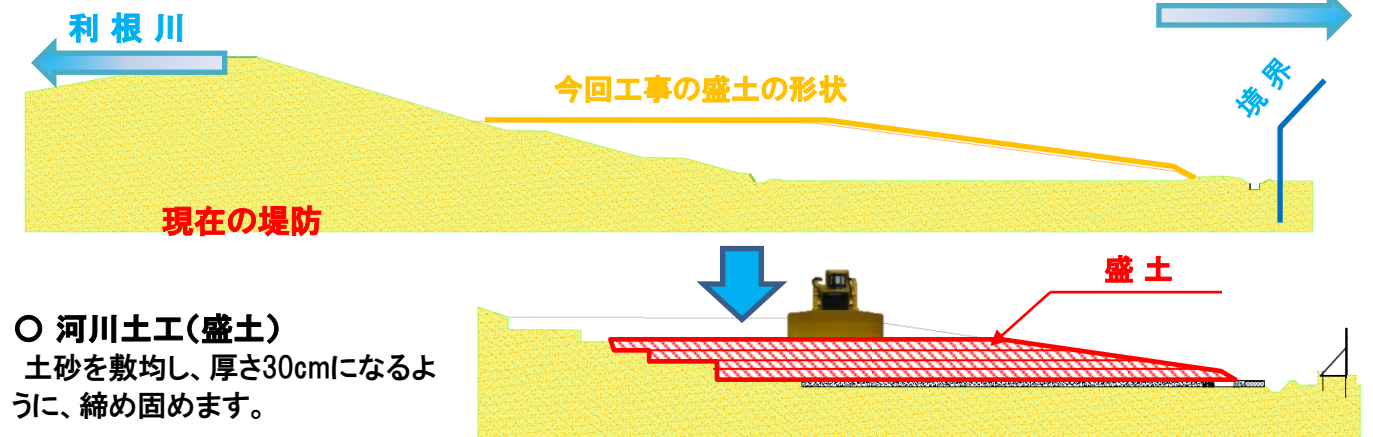

○河川土工(盛土)
土砂を敷均し、厚さ30cmになるように、締め固めます。

工事の解説


12月は、湿潤化防止工の設置(裏面写真①)、盛土工(砂質土)(裏面写真②)や、堤防の段切り作業(裏面写真③)を完了させ、1月より本格的な土砂運搬～盛土作業を行います。

土砂運搬は、ダンプトラックを5～7台使用し2月下旬頃までの運搬完了を目指します。

土砂運搬や盛土作業時は、施工による砂ぼこりが近隣の皆様へ影響を与えないよう、防塵ネットを設置し必要に応じ散水等の対策を行います。

土砂運搬経路(下図参照)は高水敷(堤防内工事用道路)を使用します。交通誘導員を配置のうえ安全第一の作業を行います。

土砂運搬経路及び交通誘導員配置図

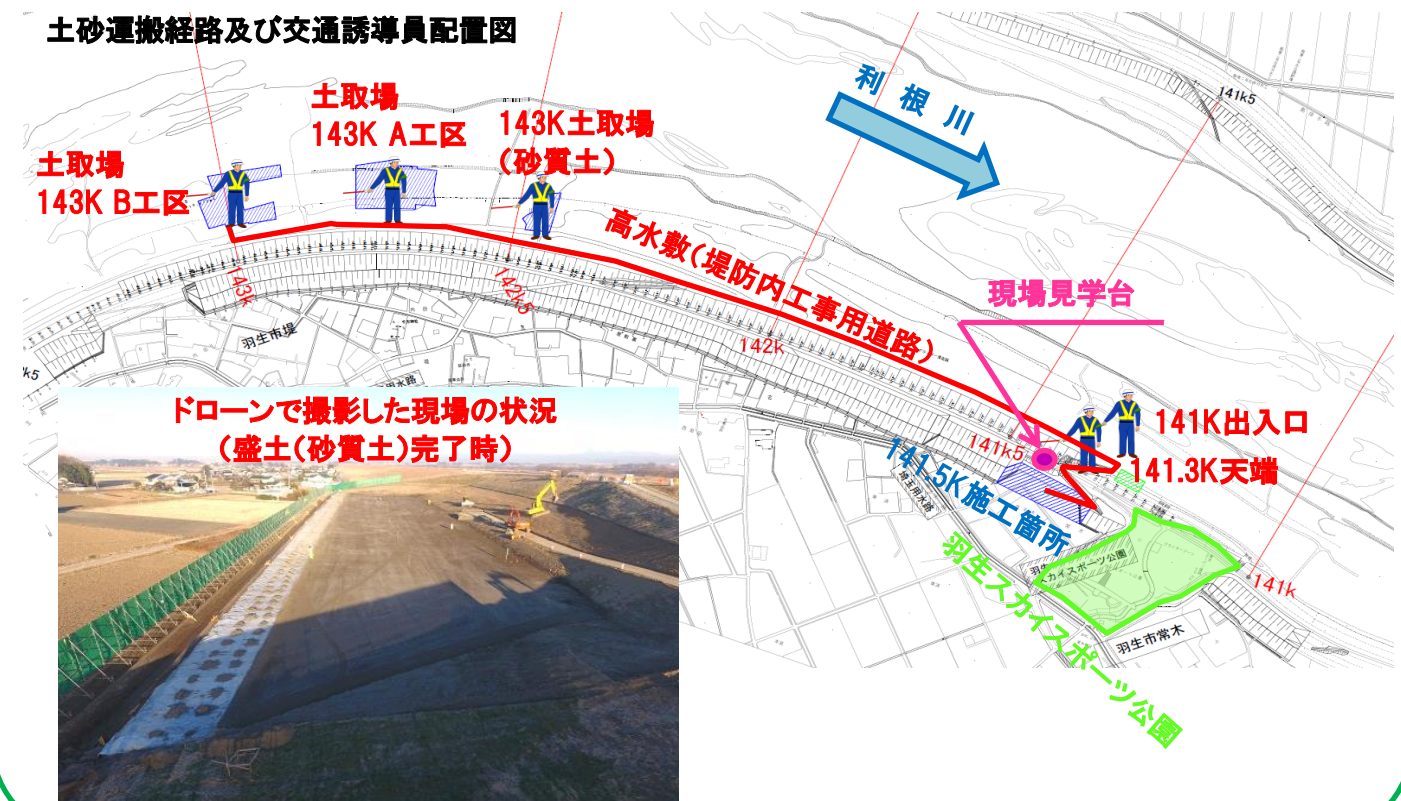

ドローンで撮影した現場の状況
(盛土(砂質土)完了時)

工事の内容	数量	作業内容の説明	平成29年 10月				11月				12月				平成30年 1月				1月				2月				3月			
			1	10	20	30	1	10	20	30	1	10	20	30	1	10	20	30	1	10	20	30	1	10	20	30	1	10	20	30
準備工(測量・調査・安全対策)	一式	工事場所の現状を調査や、安全対策を行います。																												
河川土工(掘削工・盛土工・土砂運搬等)	27800㎡	土砂の運搬や、締固めを行いながら盛土を行います。																												
(法面整形)	5390㎡	規定の幅や高さに盛土を整えます。																												
法覆護岸工(表土敷均し)	2100㎡	法面の保護を行う為に、表土を敷均します。																												
法尻処理工(湿潤化防止工)	一式	堤防内に浸入した水を堤防の外へ排水する為の構造です。																												
構造物撤去工(構造物取壊・骨材再生)	一式	盛土の支障となるコンクリート構造物を撤去し、砕き、再利用します。																												
仮設工(素掘側溝・仮設通路・防塵ネット)	一式	防塵ネット、仮設通路や素掘り水路を設置します。																												
