工事名　H27佐原ロ地先護岸災害復旧工事

工期　平成28年 8月22日～平成29年 2月28日

実 施 工 程 表

施工会社　松崎建設株式会社
現場代理人　山木 隆聡
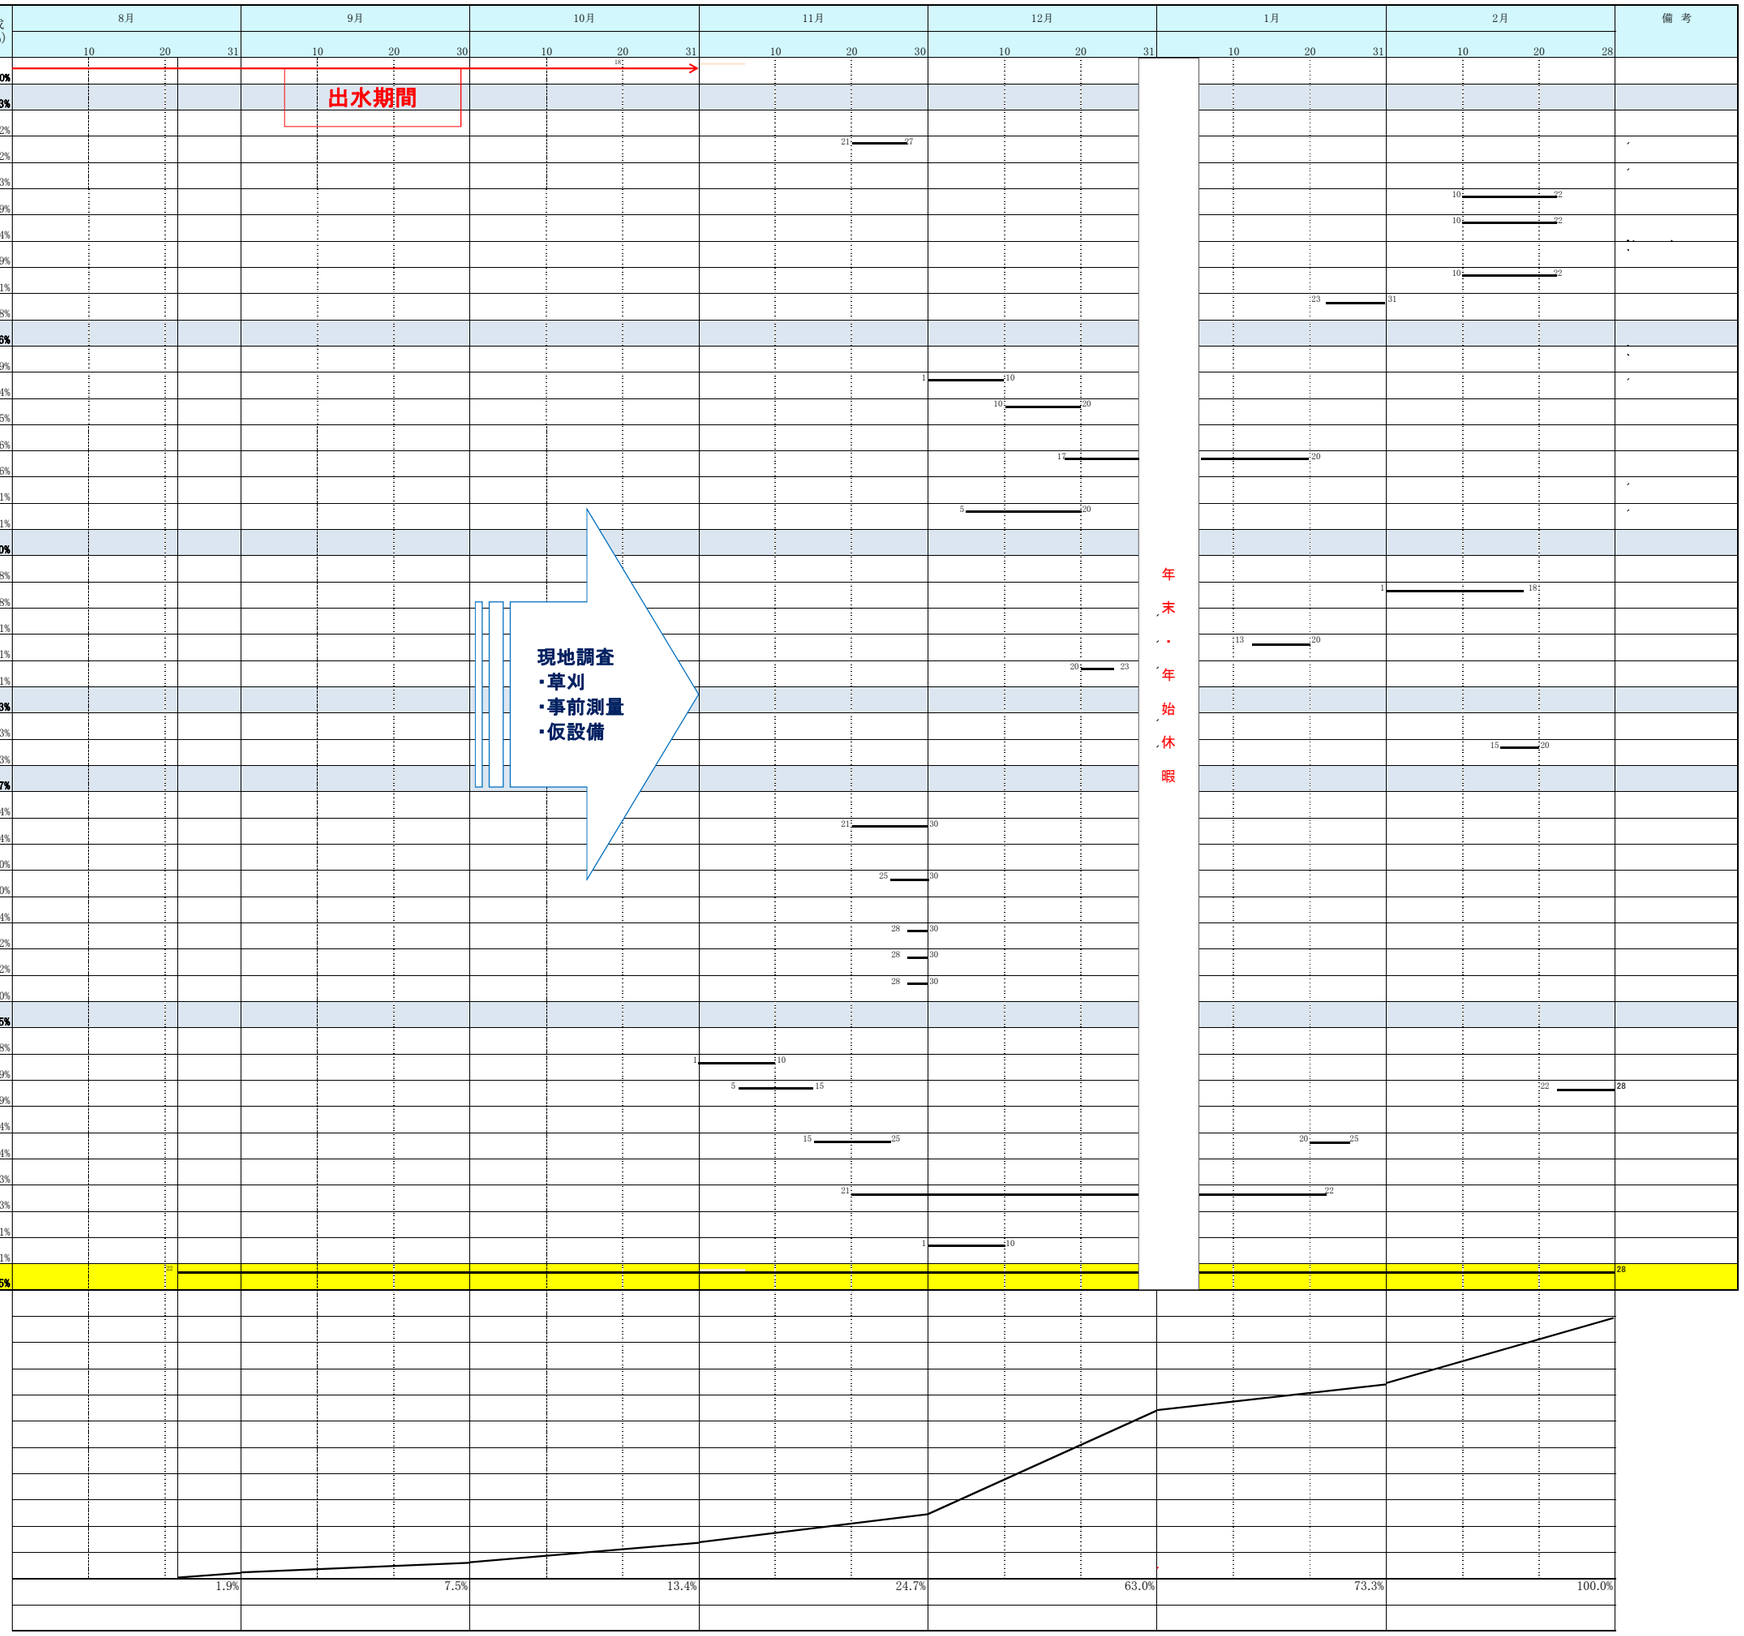
工 種 ・ 種別 ・ 細別	規格	単位	数 量	構成率(%)	備 考
築堤・護岸		式	1	100.00%	
河川土工		式	1	1.93%	
掘削工		式	1	0.02%	
掘削		m3	90	0.02%	〃
盛土工		式	1	1.33%	〃
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	230	0.99%	
土材料		m3	120	0.34%	
法面整形工		式	1	0.59%	〃
法面整形(盛土部)	無し	m2	560	0.21%	
基面整正		m2	1,110	0.38%	
矢板護岸工		式	1	33.46%	
作業土工		式	1	0.29%	〃
床堀り	土砂	式	1	0.04%	〃
埋戻し	土砂	式	1	0.25%	
笠コンクリート工		式	1	3.66%	
笠コンクリート	底幅 50cm 高さ 50cm	m	282	3.66%	
矢板工		式	1	29.51%	〃
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 8.5m	枚	314	29.51%	〃
法覆護岸工		式	1	16.40%	
コンクリートブロック工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1	15.38%	
連節ブロック張	350kg/m2以上	m2	1,705	15.38%	
護岸付属物工		式	1	1.01%	
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	底幅 50cm 高さ 60cm	箇所	4	0.31%	
小口止矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2.0m	枚	28	0.71%	
護岸摺付工		式	1	3.03%	
護岸摺付工		式	1	3.03%	
連節ブロック張	350kg/m2以上	m2	336	3.03%	
構造物撤去工		式	1	0.67%	
構造物取壊し工		式	1	0.14%	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	84	0.14%	
かご撤去工		式	1	0.10%	
じゃかご撤去	径45cm	m	86	0.10%	
運搬処理工		式	1	0.44%	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	84	0.12%	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	84	0.32%	
現場発生品運搬	じゃかご(鉄くず)	式	1	0.00%	
仮設工		式	1	8.55%	
工事用道路工		式	1	3.48%	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3	式	1	0.49%	
敷鉄板		式	1	2.99%	
土留・仮締切工		式	1	4.44%	
土のう		式	1	4.44%	
水替工		式	1	0.53%	
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満	式	1	0.53%	
交通管理工		式	1	0.11%	
交通誘導警備員		式	1	0.11%	
共通仮設費		式	1	35.95%
