工事名称	県立武道館建築工事	週間工程表		現場代理人	監理技術者	監理技術者	作成者
工期	平成30年　7月　6日～平成32年　1月16日			三浦	佐藤	依田	横田
作成日	平成30年12月7日						

期間		H30.11 先週 3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	H30.12 9 日	今週 10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	来週 16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土
仮設工事																					
主道場													約500㎡								
1工区	A	ｽﾗﾌﾞ型枠		ｽﾗﾌﾞ配筋								止め枠	ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ	墨出し							
	B		ｽﾗﾌﾞ型枠			ｽﾗﾌﾞ型枠			ｽﾗﾌﾞ配筋				ｽﾗﾌﾞ配筋								
2工区	C	埋め戻し（外回り→中通路作成														ｽﾗﾌﾞ配筋					
	D																				
3工区	E	型枠解体		ｾﾊﾟ折、錆止め					足場解体		埋め戻し		ｽﾗﾌﾞ型枠				ｽﾗﾌﾞ配筋				
		洗い	ｺﾝ足場解体 型枠解体			ｾﾊﾟ折、錆止め															
	F			足場	地中梁ｺﾝｸﾘｰﾄ 140㎥	洗い		ｺﾝ足場解体		型枠解体		ｾﾊﾟ折、錆止め				足場解体			埋め戻し		
						足場			地中梁ｺﾝｸﾘｰﾄ 135㎥	洗い	ｺﾝ足場解体	型枠解体									
	G																				
4工区	H	型枠解体		ｾﾊﾟ折、錆止め		足場解体			埋め戻し		ｽﾗﾌﾞ型枠					ｽﾗﾌﾞ配筋					
	I	梁型枠							足場	地中梁ｺﾝｸﾘｰﾄ 171㎥	洗い	ｺﾝ足場解体		型枠解体		ｾﾊﾟ折、錆止め		足場解体			
	J	梁配筋			梁型枠							足場			地中梁ｺﾝｸﾘｰﾄ 120㎥	洗い	ｺﾝ足場解体	型枠解体			
																足場	地中梁ｺﾝｸﾘｰﾄ 120㎥	洗い	ｺﾝ足場解体		
道場1	K			足場	段差補強筋、他まとめ				地中梁ｺﾝｸﾘｰﾄ 157㎥	洗い	ｺﾝ足場解体	型枠解体				ｾﾊﾟ折、錆止め		足場解体		埋め戻し	
5工区	L	梁型枠							足場		さし筋、他まとめ		地中梁ｺﾝｸﾘｰﾄ 150㎥			洗い	ｺﾝ足場解体	型枠解体		ｾﾊﾟ折、錆止め	
道場2	M	梁配筋			梁型枠							足場			地中梁ｺﾝｸﾘｰﾄ 150㎥	洗い		ｺﾝ足場解体		型枠解体	
6工区	N	地足場	梁配筋						梁型枠						段差補強筋、他まとめ	足場	さし筋、他まとめ	地中梁ｺﾝｸﾘｰﾄ 150㎥		洗い	
搬出入車両予定																					
					仮設材　10tﾕﾆｯｸ車																
				生ｺﾝ大型 ﾐｷｻｰ35～37台					生ｺﾝ大型 ﾐｷｻｰ38～40台		生ｺﾝ大型 ﾐｷｻｰ25～27台		生ｺﾝ大型 ﾐｷｻｰ38～40台		生ｺﾝ大型 ﾐｷｻｰ30～33台		生ｺﾝ大型 ﾐｷｻｰ30～33台					
					生ｺﾝ大型 ﾐｷｻｰ34～36台				生ｺﾝ大型 ﾐｷｻｰ43～45台							生ｺﾝ大型 ﾐｷｻｰ38～40台		生ｺﾝ大型 ﾐｷｻｰ70～75台				
特記事項（行事予定等）			定例打合			一斉清掃	全休日	全休日	定例打合		一斉清掃		全休日		定例打合				一斉清掃		全休日

備　考

※近隣説明会にて説明事項
・作業時間：8時30分～17時30分
7時30分～8時30分は作業準備時間とします。
作業前ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ・朝礼8時～
昼休憩　12時～13時
掃除・後片付け～18時30分

・日曜日及び第2土曜日（現場状況により振り替えます。）年末・年始・GW・盆期間の作業は休止します。

・ﾍﾞｰｽ・地中梁ｺﾝｸﾘｰﾄ打設の日は、早出作業を行います。

※天候によりｺﾝｸﾘｰﾄ打設等の車両の出入が順延される場合があります。
その際は、案内看板にて表示します。

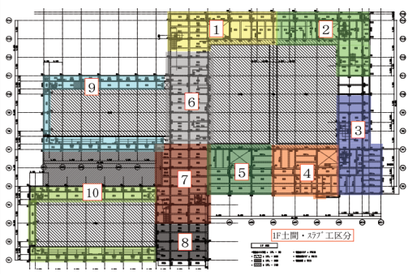

工区分図(1Fｽﾗﾌﾞ)

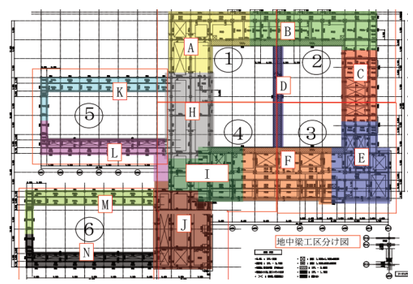

工区分図(地中梁)
