工　事　名 ： 金沢処理区杉田地区下水道整備工事(その48)
工　　期 ： 令和7年8月1日～令和8年9月30日

計　画　工　程　表

令和7年8月22日
株式会社　松尾工務店

工種	数量	備考
準備工、事業損失防止施設費	1式	
施工計画、設計照査、関係機関との打合せ協議等	1式	
試掘工、本管潜行目視調査、チェックボーリング	1式	
家屋調査、観測井戸設置	5箇所 4箇所	
立坑工	1式	
No.1 φ3000ケーシング立坑 H=9.1m	1基	
No.2 φ3000ライナー立坑 H=10.5m	1基	
No.1、No.2薬液注入工	32本 105本	
立坑埋戻し	1式	
推進工	1式	
φ1200泥濃式推進工 No.1→No.2	27.6m	
φ700(500)鋼製さや管推進(斜坑)No.2→φ4250	6.3m	
φ1350(1100)鋼製さや管推進(水平)No.1→□3600×2250	9.6m	
マンホール工		
第5種組立人孔	2基	
マンホール蓋設置工	4箇所	
付帯工		
既設構造物撤去	1式	
開口設置工(φ1000合成鋼管)	5箇所	
越流壁設置工	1箇所	
遮断壁設置工	2箇所	
舗装復旧工、区画線工	1式	
仮設工	1式	
共通仮設費	1式	

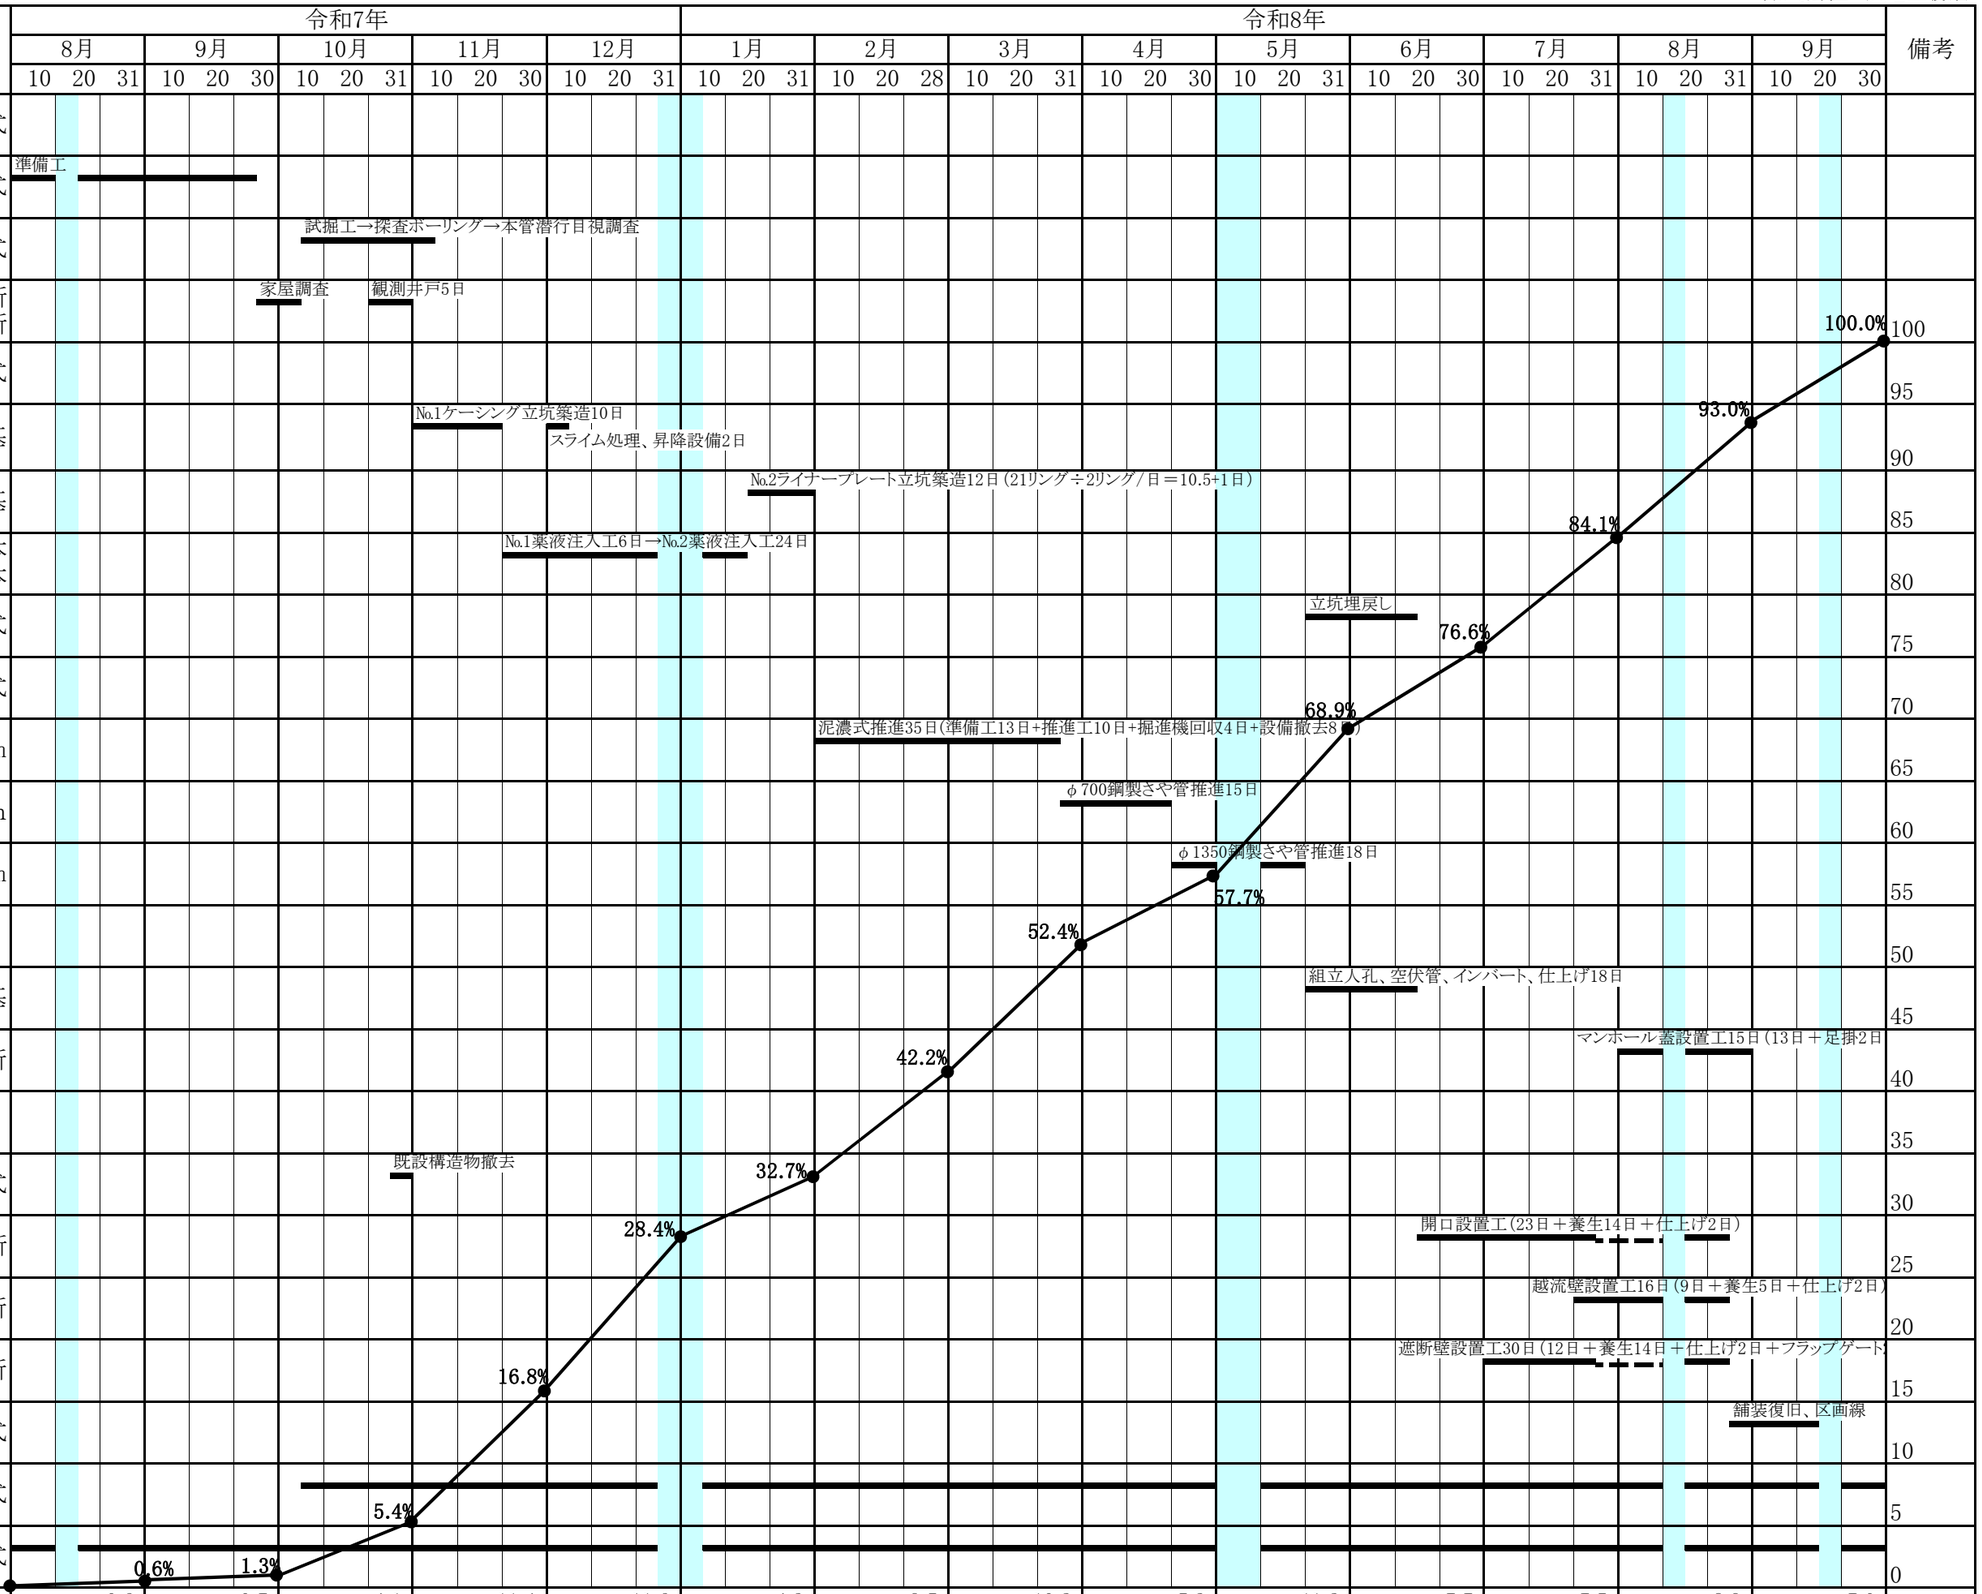

出来高(%)															
	予定	月	0.6	0.7	4.1	11.4	11.6	4.3	9.5	10.2	5.3	11.2	7.7	7.5	8.9	7.0
		累計	0.6	1.3	5.4	16.8	28.4	32.7	42.2	52.4	57.7	68.9	76.6	84.1	93.0	100.0
	計画	月														
		累計														
